

SNGR - Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Subsecretaría de Reducción de Riesgos

Dirección de Fortalecimiento y desarrollo de capacidades en gestión de riesgos

PROYECTO: K003 Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el riesgo de desastre en la población.

Líder del Proyecto:	Salvador Mosquera, Gustavo Alejandro (subsecretario.reduccion@gestionderiesgos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Hermenejildo De La A, Andrea Valeria	Programas Relacionados:	
Titular:	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30340000.0000.387748	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,616,124.03
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2023 - 12/01/2026
Fecha de última actualización:	26/03/2025	Fecha de Fin Base:	14/03/2023
Modificado por:	Salvador Mosquera, Gustavo Alejandro	Fecha del siguiente hito:	30/04/2024

DATOS GENERALES

Descripción

FIN: Incrementar la resiliencia de la población ante la ocurrencia del evento de origen volcánico.

PROPÓSITO: Reducir los riesgos de desastres en la población vulnerable a la amenaza de origen volcánico.

Beneficios Cualitativos

Los beneficios son de tipo social y económico en relación al:

- Fortalecimiento del monitoreo de la amenaza volcánica.
- Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los GAD para la reducción de riesgos de desastres frente a la amenaza volcánica.
- Fortalecimiento del conocimiento y conciencia del riesgo volcánico por parte de la ciudadanía.

Tipo de Beneficiario


La población vulnerable a la amenaza de origen volcánico de las provincias: Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Morona Santiago, Napo y Galápagos.

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 74.80 %

Fecha de Inicio: 02/01/2023

Fecha de Fin: 12/01/2026

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

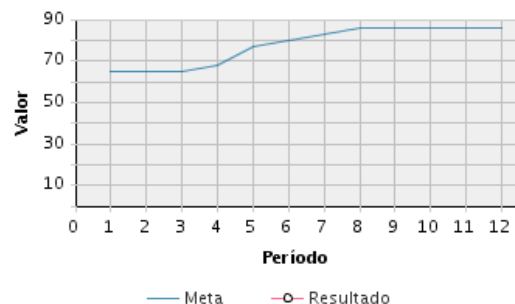

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
	65 %	65 %	65 %	68 %	77 %	80 %	83 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2025: Con fecha 18 de febrero de 2025, mediante Memorando SNGR-SRR-2025-0036-M, el Subsecretario de Reducción de Riesgos, Gustavo Salvador solicitó modificación al PAI, para la inclusión de la Subactividad Adquisición de kits educativos para sensibilización a la población en temas relacionados con la reducción y prevención del riesgo. La aprobación a la solicitud realizada se emite mediante Memorando Nro. SNGR-PLA-INV-2025-0091-M, del 19 de febrero de 2025. El 25 de febrero de 2025, mediante Memorando Nro. SNGR-SGIAR-2025-0026-M, suscrito por el Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, Ing. Daniel Sánchez, solicitó la liberación de recursos asignados al "Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional y Co-ejecución de Proyecto entre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Escuela Politécnica Nacional", por un monto de USD 406,603.95. En este Memorando explica que, debido a las emergencias derivadas de la temporada lluviosa, se requiere la liberación de recursos no transferidos al IG-EPN y reasignar a las áreas priorizadas en atención a la emergencia (Asociado hito 22).	Salvador Mosquera, Gustavo Alejandro	26/03/2025 - 07:38 PM
ALCANCE ENERO 2025: Mediante Memorando Nro. SNGR-CGPGE-2025-0039-M, del 28 de enero de 2025, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica pone en conocimiento el inicio formal de la fase de ejecución presupuestaria de las distintas Unidades Operativas de la SNGR, de los recursos "no permanentes" (gasto de inversión-PAI) a fin que se sirvan seguir el debido proceso para la ejecución de las actividades del PAI 2025.	Salvador Mosquera, Gustavo Alejandro	26/03/2025 - 12:17 PM
ENERO 2025: Se actualiza la información del proyecto, con base en la planificación presupuestaria. Se consolida la información de la ejecución por parte del IGEPN; informe remitido con fecha 15 de enero del 2024.	Salvador Mosquera, Gustavo Alejandro	12/02/2025 - 04:49 PM
DICIEMBRE 2024: Se consolida el cierre del ejercicio fiscal 2024, con los siguientes resultados: * Adquisición de maquetas didácticas de simulación para la sensibilización sobre riesgos volcánicos, ejecutado por un monto de \$ 17.000,00 * Servicio de diseño e impresión de material educomunicacional para el fortalecimiento del conocimiento volcánico y disminuir el riesgo de desastre en la población ecuatoriana, ejecutado por un monto de \$ 9.108,00. * Adquisición por Catálogo Electrónico de Bolsos, Gorras y Bordados en ambas prendas para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres. Por un total de: \$6.239,00 (bolsos 1.989,00 USD, estampados \$425,00; gorras por \$2.975,00 y bordados \$ 850,00) Por un total de: \$6.239,00. * Adquisición de digitalizadores de 6 canales, digitalizadores de 3 canales y sensores sísmicos banda ancha, por un monto de \$ 434.990,00. * Adquisición de dos estaciones geodésicas GNSS de referencia de última generación, por un monto de \$ 52.000,00. NOVIEMBRE 2024: Cumpliendo con el plazo contractual, el 15 de noviembre de 2024 se realizó la entrega final de los productos del Contrato SIE-SGR-2024-004, correspondiente a la adquisición de maquetas didácticas de simulación para la sensibilización sobre riesgos volcánicos. Como se menciona en el resumen del mes de junio, el proceso adquisición de maquetas didácticas de simulación para la sensibilización sobre riesgos volcánicos, ingresa como una parte de los productos que aportan a la ejecución del hito 12 del proyecto, debido a que, por	Salvador Mosquera, Gustavo Alejandro	11/02/2025 - 03:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
presupuesto, la actividad completa de Contratación de servicios para la construcción del diseño de la campaña educacional ante riesgo de erupción volcánica será pospuesta para el año 2025. (Hito 12). El 29 de noviembre de 2024, se cumplió con la entrega - recepción del Servicio de diseño e impresión de material educacional para el fortalecimiento del conocimiento volcánico y disminuir el riesgo de desastre en la población ecuatoriana. Se recibieron los productos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y se entrega la documentación para el proceso de liquidación de correspondiente, de esta manera finaliza la etapa contractual. (Hitos 13 y 15). El proceso de Adquisición de artículos varios para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres, durante el mes de noviembre se realizó el proceso de adjudicación, sin embargo, no se logró comprometer los recursos, debido al cronograma de cierre de algunos procesos establecidos por el Ministerio de Finanzas. (Hito 14). Conforme lo registrado en el resumen ejecutivo del mes de abril de 2024, el presupuesto asignado no cubre la ejecución de cuatro hitos, los cuales no se lograrían ejecutar durante el período fiscal 2024; sin embargo, la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos, ha considerado el registro de cumplimiento de dos hitos (hitos 19 y 20), los cuales se han ejecutado con el aporte de otro proyecto de inversión, pues en su conjunto todos estos proyectos se complementan y son financiados con recursos fiscales. Con fecha 27 de noviembre de 2024, se suscribió el Contrato Nro. RE-OACL-SNGR-2024-001, cuyo objeto es la "Contratación del servicio de conceptualización, diseño, ambientación, implementación y montaje de los componentes escénicos y lúdicos de las ferias de prevención de riesgos", con esta contratación se cumple con los hitos 19 y 20 del proyecto.		
OCTUBRE 2024: Durante el mes de octubre se ejecutó la fase contractual de los siguientes procesos: .Adquisición de maquetas didácticas de simulación para la sensibilización sobre riesgos volcánicos (Hito 12.) .Adquisición por Catálogo Electrónico de Bolsos, Gorras y Bordados en ambas prendas para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres. Se cumplió con la entrega de los productos de las órdenes de compra el 01 de octubre de 2024, (gorras), el 24 de octubre (bolsos), finalizando la etapa contractual (Hito 16). .Servicio de diseño e impresión de material educacional para el fortalecimiento del conocimiento volcánico y disminuir el riesgo de desastre en la población ecuatoriana, Contrato suscrito el 01 de octubre, tienen un plazo de 60 días, plazo que finalizará el 30 de noviembre de 2024. (Hitos 13 y 15). Se levantó nuevamente el proceso Contratación del servicio para la elaboración de Material educacional - audiovisual para el Fortalecimiento ciudadano frente a las amenazas volcánicas, desde la fase preparatoria. Se publicó los pliegos para el inicio de la fase precontractual. (Hito 18). En el caso del proceso Adquisición de artículos varios para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres, con fecha 23 de octubre se emitió la declaratoria desierto, con lo cual se reformula el proceso, mismo que inicia nuevamente desde la fase preparatoria. (Hito 14).	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	21/11/2024 - 10:25 AM
SEPTIEMBRE 2024: Se emitió la resolución de inicio del proceso de Adquisición por Catálogo Electrónico de Bolsos, Gorras y Bordados en ambas prendas para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres. Se generaron las órdenes de compra e inicia el proceso contractual (Hito 16). Para el proceso Adquisición de artículos varios para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres, durante el mes de septiembre se solicitó la reforma PAC y la autorización	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	21/11/2024 - 10:24 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
aval y certificación presupuestaria; así como también la emisión de la Resolución de Inicio del proceso (Hito 14). Con el proceso Contratación del servicio para la elaboración de Material educativo-audiovisual para el fortalecimiento ciudadano frente a las amenazas volcánicas se realizó la etapa precontractual hasta su declaratoria desierto el 24 de septiembre de 2024 (Hito 18). Con fecha 25 de septiembre de 2024 se suscribe el contrato SIE-SGR-2024-004, del proceso Adquisición de maquetas didácticas de simulación para la sensibilización sobre riesgos volcánicos. Este contrato tiene plazo de ejecución de 70 días, el cual finalizará el 04 de diciembre de 2024 (Hito 12).		
AGOSTO 2024: En el mes de agosto se realizó la solicitud de autorización aval y certificación presupuestaria, del proceso: Adquisición por Catálogo Electrónico de Bolsos, Gorras y Bordados en ambas prendas para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres. Se realizó una modificación al PAI por cambio de ítem presupuestario en este proceso, cambio que se realizó del ítem presupuestario 730802 (vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad), al ítem 730812 (materiales didácticos). Se liquida la certificación PAI anterior y se emite una nueva certificación, se solicitó la certificación PAC y también la autorización aval y certificación presupuestaria y se solicitó la autorización de inicio del proceso (Hito 16). Con el proceso Adquisición de artículos varios para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres, durante el mes de agosto se ingresó al simulador de compra del catálogo electrónico, se solicitó la certificación PAI (Hito 14). Con el proceso, Servicio de diseño e impresión de material educativo-audiovisual para el fortalecimiento del conocimiento volcánico y disminuir el riesgo de desastre en la población ecuatoriana, durante el mes de agosto se emitió la certificación presupuestaria y se emitió la Resolución para inicio del proceso (Hitos 13 y 15). El proceso de Contratación del servicio para la elaboración de Material educativo-audiovisual para el fortalecimiento ciudadano frente a las amenazas volcánicas, cumplió con la etapa preparatoria con la Resolución de inicio del proceso que se emitió el 30 de agosto de 2024 (Hito 18). Para el proceso Adquisición de maquetas didácticas de simulación para la sensibilización sobre riesgos volcánicos, el 19 de agosto de 2024, se emitió la Resolución de declaratoria desierto y se dispone la reapertura del proceso, mismo que inicia con la publicación del procedimiento en el portal del SERCOP el 19 de agosto y finaliza con la adjudicación el 09 de septiembre de 2024, dando paso a la etapa contractual (Hito 12).	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	20/11/2024 - 05:10 PM
JULIO 2024: Se preparó el informe de necesidad y especificaciones técnicas de los siguientes procesos: .Adquisición de artículos varios para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres. De este proceso se realizó la verificación CATE y la publicación en el portal del SERCOP para el estudio de mercado, (vinculado al hito 14 del proyecto) .Adquisición por Catálogo Electrónico de Bolsos, Gorras y Bordados en ambas prendas para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres. De este último, se ingresó al simulador de compra del catálogo electrónico para verificación del producto. Se emitió la certificación PAI y se solicitó también la reforma al PAC, (vinculado al hito 16 del proyecto). Con el proceso Servicio de diseño e impresión de material educativo-audiovisual para el fortalecimiento del conocimiento volcánico y disminuir el riesgo de desastre en la población ecuatoriana, se solicitó verificación CATE y se publicó en el portal del SERCOP para el estudio de mercado. Durante este mes también se emitió la certificación PAI y solicitó la reforma PAC. (Hitos 13 y 15). Durante el mes de julio, el proceso Adquisición de maquetas didácticas de simulación para la sensibilización sobre riesgos volcánicos cumplió con la etapa preparatoria hasta la resolución de	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	20/11/2024 - 05:05 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Inicio que fue emitida con fecha 29 de julio de 2024. La etapa precontractual se ejecutó desde el 30 de julio. (Hito 12).		
JUNIO 2024: Se preparó el informe de necesidad y términos de referencia para los procesos: .Servicio de diseño e impresión de material educomunicacional para el fortalecimiento del conocimiento volcánico y disminuir el riesgo de desastre en la población ecuatoriana", misma que corresponde a los hitos 13 y 15 del proyecto. ."Contratación del servicio para la elaboración de Material educomunicacional - audiovisual para el fortalecimiento ciudadano frente a las amenazas volcánicas", (vinculado al hito 18 del proyecto). .Adquisición de maquetas didácticas de simulación para la sensibilización sobre riesgos volcánicos, de este proceso se realizó también la verificación CATE y la publicación en el portal del SERCOP para el estudio de mercado. Este proceso ingresa como una parte de los productos que aportan a la ejecución del hito 12 del proyecto, debido a que, por presupuesto, la actividad de Contratación de servicios para la construcción del diseño de la campaña educomunicacional ante riesgo de erupción volcánica será pospuesta para el año 2025. (vinculado al hito 12). En el mes de junio se realizó una modificación al PAI, por cambio de nombre en las subactividades alineadas al proyecto Fortalecimiento del conocimiento volcánico.	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	20/11/2024 - 05:05 PM
MAYO 2024: Con fecha 16 de mayo del 2024 mediante correo electrónico, la Dirección de Planificación e Inversión solicita a la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades se remita las subactividades a realizar por parte de esta dirección a la actividad del componente 3. Fortalecimiento del conocimiento y conciencia del riesgo volcánico por parte de la ciudadanía, que contiene la actividad 3.1 Implementación y puesta en marcha de una campaña educomunicacional para la generación de conciencia ciudadana frente al riesgo de erupción volcánica (SRR), con la finalidad de mejorar los procesos de gestión relacionados al fortalecimiento ciudadano, la participación activa de la población y la transferencia de conocimiento. Donde se asigna un presupuesto para este año fiscal. A partir del 22 de mayo del 2024 se realiza la modificación PAI por parte de la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades, para solicitar el presupuesto que será ejecutado de acuerdo a las actividades planificadas por la Dirección, siendo las siguientes: .Adquisición de maquetas didácticas de simulación para la sensibilización sobre riesgos volcánicos. Monto asignado: \$28.567,20. (Hito 12) .Contratación del servicio para la elaboración de Material educomunicacional - audiovisual para el Fortalecimiento ciudadano frente a las amenazas volcánicas. Monto asignado: \$15.000,00. (Hito 18) .Servicio de diseño e impresión de material educomunicacional para el fortalecimiento del conocimiento volcánico y disminuir el riesgo de desastre en la población ecuatoriana. Monto asignado: \$12.000,00. (Hitos 13 y 15) .Adquisición por Catálogo Electrónico de Bolsos, Gorras y Bordados en ambas prendas para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres. Monto asignado: \$8.000,00. (Hito 16) .Adquisición de artículos varios para la entrega a niños en edad escolar durante el plan de sensibilización en el fortalecimiento de capacidades de la población para la reducción del riesgo de desastres. Monto asignado: \$ 16.456,00. (Hito 14)	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	20/11/2024 - 05:02 PM
ABRIL2024: Con fecha 11 de abril del 2024, se socializa la resolución Nro. SNGR-054-2024 donde se aprueba el plan de inversión (PAI) del año 2024 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, para ser ejecutado de acuerdo al ajuste de gasto de inversión. Es importante indicar que el presupuesto asignado para el año 2024 es de \$79.567,20, motivo por el cual no se logró planificar la ejecución de algunos hitos contemplados en este proyecto, siendo los siguientes: .Hito 11. Contratación de personal educomunicacional para la gestión de riesgos. .Hito 17. Elaboración de videos de realidad virtual sobre la amenaza volcánica. .Hito 19. Servicio de consultoría para el diseño y montaje de exposiciones fotográficas/artísticas sobre erupciones volcánicas y otras amenazas. .Hito 20. Servicio de consultoría para el diseño, montaje y presentación de obras de teatro sobre erupciones volcánicas y otras amenazas.	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	20/11/2024 - 05:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2024: Durante el mes de marzo no se registran actividades inherentes al proyecto. Sin embargo, dentro de la gestión, se realiza un informe ejecutivo del estado del proyecto y su ejecución durante el año 2023.	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	20/11/2024 - 05:00 PM
FEBRERO 2024: Con fecha 02 de febrero 2024 se da inicio a la fase preparatoria de los procesos de contratación planificados por la SNGR, específicamente del proceso "Contratación de servicios para la construcción del diseño de la campaña educomunicacional ante riesgo de erupción volcánica" con la preparación de la versión borrador de los TDR. (Hito 12). Mediante Memorando Nro. SGR-SGGR-2024-0030-M, del 27 de febrero del 2024, con Resolución Nro. SNGRE-059-2021, se designa líder del proyecto a Stefany Gilces Bravo, Directora de Fortalecimiento y Desarrollo de capacidades.	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	20/11/2024 - 04:53 PM
ENERO 2024: Durante el mes de enero no se registran actividades inherentes a los hitos del proyecto. Se remite el PAI preliminar y se registra en la herramienta PPA, en el cual se han planificado 10 procesos de contratación.	Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	20/11/2024 - 04:41 PM
DICIEMBRE 2023: Con fecha 27 de diciembre de 2023, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional remite el informe sobre el estado de ejecución de las adquisiciones donde concluye lo siguiente: .Durante el año fiscal 2023 se alcanza una ejecución sobre el devengado de 27% y sobre el comprometido del 67%. .Se realizaron 17 de los 19 procesos de adquisición planificados en el proyecto. De los procesos realizados, dos se declararon desiertos y una orden de compra no se firmó. .Hay dos procesos que se encuentran en etapa de ejecución y que finalizarán en el próximo año fiscal. .Entre el valor presupuestado dentro del proyecto para las adquisiciones del año 2023 y los valores certificados una vez que se realizaron los estudios de mercado existió un ahorro de USD 116.559,11 que corresponde al 15,9% del presupuesto anual. .En los procesos de compra realizados se logró un ahorro de USD 39.848,84 frente a lo certificado, lo cual representa en ahorro de 5,43% con respecto al presupuesto anual. .Considerando los valores de ahorro obtenidos en las etapas de actualización de estudio de mercado y la etapa de subasta inversa o negociación se alcanza la ejecución del 87,99%.	García Montero, Lida Morayma	23/01/2024 - 08:29 PM
NOVIEMBRE 2023: Durante el mes de noviembre, no se registra actividades inherentes al proyecto y se delinea la planificación de los procesos de contratación del siguiente período fiscal, alineados a los objetivos y actividades contempladas en el Proyecto Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el riesgo de desastre en la población.	García Montero, Lida Morayma	23/01/2024 - 08:27 PM
OCTUBRE 2023: Con fecha 30 de octubre de 2023, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, realiza el informe técnico de modificación al proyecto de inversión Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el riesgo de desastre en la población, para la inclusión y transferencia de recursos al Proyecto "Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras", por un monto de \$135.554,03, de los cuales \$112.551,72 corresponden al proyecto Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el riesgo de desastre en la población .	García Montero, Lida Morayma	23/01/2024 - 08:26 PM
SEPTIEMBRE 2023: Mediante Memorando Nro. SGR-CGPGE-2023-0784-M, del 20 de septiembre de 2023, se liquida la Certificación PAI Nro. CGPGE-CERTPAI-2023-054 - Egreso no permanente - Subactividad PAI: Contratación de servicios para la construcción del diseño de la campaña educomunicacional ante riesgo de erupción volcánica.	García Montero, Lida Morayma	23/01/2024 - 08:25 PM
AGOSTO 2023: Mediante Resolución Nro. SGR-301-2023, del 01 de agosto de 2023, se aprueban los pliegos y autoriza el inicio del proceso de contratación directa de consultoría, signado con el código CDC-SGR-004-2023, cuyo objeto es la Contratación de servicios para la construcción del diseño de la campaña educomunicacional ante el riesgo de erupción volcánica. Mediante Resolución Nro. SGR-343-2023, del 22 de agosto de 2023, se declara DESIERTO el procedimiento de Contratación Directa de Consultoría signado con Nro. CDC-SGR-004-2023, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO DE LA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL ANTE RIESGO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA", de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, b. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley, al haber incurrido en causal de rechazo.	García Montero, Lida Morayma	23/01/2024 - 08:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2023: Con fecha 04 de julio, se declara DESIERTO el procedimiento de Contratación Directa de Consultoría signado con Nro. CDC-SGR-003-2023, cuyo objeto es la contratación del "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RESPECTIVO PAQUETE METODOLÓGICO E INSTRUMENTOS DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LOS GAD PROVINCIALES Y PARROQUIALES", de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, b. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley, al haber incurrido en causal de rechazo.	García Montero, Lida Morayma	23/01/2024 - 08:23 PM
JUNIO 2023: Con fecha 05 de junio de 2023, se realiza la publicación de los pliegos en el portal de compras públicas para el proceso "Consultoría para la generación de lineamientos y respectivo paquete metodológico e instrumentos de los Lineamientos para la gobernanza en los GAD provinciales y parroquiales"	García Montero, Lida Morayma	22/01/2024 - 07:26 PM
MAYO 2023 Con fecha 19 de mayo de 2023, en el portal de compras públicas se publican los pliegos del proceso de contratación Servicio de consultoría para implementar los lineamientos para la gobernanza de la gestión de riesgos de desastres en los cantones potencialmente afectados por la amenaza volcánica.	García Montero, Lida Morayma	22/01/2024 - 07:24 PM
ABRIL 2023: Como parte de la fase preparatoria de los procesos de contratación, durante el mes de abril se realizó la modificación PAI, mediante la cual se hizo una reducción del presupuesto en la subactividad "Servicio de consultoría para la asistencia técnica para la actualización de los PDyOT en el marco de los lineamientos establecidos por el ente rector" para incrementar en la subactividad PAI Servicio de consultoría para la generación de lineamientos y respectivo paquete metodológico e instrumentos de los lineamientos para la gobernanza de la gestión de riesgos de desastres en los GAD provinciales y parroquiales, por un monto de \$15.700.	García Montero, Lida Morayma	22/01/2024 - 07:24 PM
MARZO 2023: Mediante Oficio Nro. SGR-SGR-2023-0236-O, del 17 de marzo de 2023, dirigido a la Dra. Florinella Muñoz, Rectora de la Escuela Politécnica Nacional, se informó que el Ministerio de Economía y Finanzas realizó la transferencia de recursos a la Escuela Politécnica Nacional, los cuales serán ejecutados por el Instituto Geofísico - IG, por el monto de USD.733.449,08 (Hito 7).	García Montero, Lida Morayma	22/01/2024 - 07:22 PM
FEBRERO 2023: Durante el mes de febrero se registra en la plataforma GPR el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Gestión de Riesgos (antes Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia) y la Escuela Politécnica Nacional, suscrito el 28 de noviembre de 2022 con el objeto de "Establecer y delinear los mecanismos que permitan realizar actividades conjuntas y de cooperación interinstitucional encaminadas a los estudios, evaluaciones de los factores de riesgo: amenazas y vulnerabilidades, cuyo fin será la gestión del riesgo, los mismos se ejecutarán a través de proyectos u otras actividades que se encuentren alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al marco de SENDAI para la Reducción de Riesgos de Desastres y al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. (Hito 4). Se da inicio a la fase preparatoria de los procesos de contratación ejecutados por la SGR. Con fecha 14 de febrero de 2023, mediante Memorando Nro. SGR-SGGR-2023-0016-M, el Subsecretario General realiza la designación como líder del proyecto Fortalecimiento de conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el riesgo de desastre en la población. (Hito 5) Con fecha 17 de febrero de 2023 se suscribe el convenio específico de cooperación interinstitucional y co-ejecución de proyecto entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Escuela Politécnica Nacional. El objeto de este convenio es: Co-ejecutar el componente «Fortalecimiento del monitoreo de la amenaza volcánica» del proyecto de inversión «Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el riesgo de desastre en la población», con Código Único de Proyecto (CUP): 30340000.0000.387748; por parte de la Escuela Politécnica Nacional a través del Instituto Geofísico (IG), mediante la transferencia de recursos económicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos; con el propósito de reducir los riesgos de desastres en la población vulnerable a la amenaza de origen volcánico, de conformidad con sus respectivas competencias y lo previsto en este instrumento (Hito 6).	García Montero, Lida Morayma	22/01/2024 - 07:21 PM
ENERO 2023: Se cuenta con el documento del proyecto elaborado, mismo que fue trabajado en el año 2022 (Hito 1).	García Montero, Lida Morayma	22/01/2024 - 07:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Con fecha 16 de enero de 2023, La Secretaría Nacional de Planificación, a través del Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0019-O, emite el Dictamen de prioridad para el Proyecto Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el riesgo de desastre en la población (Hito 2).		
Con fecha 27 de enero de 2023, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, mediante Memorando Nro. SGR-CGPGE-2023-0064-M, informa que el Ministerio de Economía y Finanzas atendió la solicitud de asignación de organismo y correlativo para los egresos no permanentes del presupuesto, otorgando el organismo 8888 y correlativo 8888 (Hito 3).		

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Perfil del proyecto o proyecto, elaborado.	4-Inicio de Trabajo	02/01/2023		02/01/2023		Sí	5.0
2	PLANIFICACION: Dictamen de prioridad del proyecto, recibido.	5-Entregables Intermedios	16/01/2023		16/01/2023		Sí	3.0
3	PLANIFICACION: Asignación de presupuesto por parte del MEF, realizada.	5-Entregables Intermedios	27/01/2023		27/01/2023		Sí	3.0
4	PLANIFICACION: Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional SGR-EPN, suscrito	5-Entregables Intermedios	01/02/2023		01/02/2023		Sí	3.0
5	PLANIFICACION: Designación del Líder del proyecto, realizada.	5-Entregables Intermedios	14/02/2023		14/02/2023		Sí	3.0
6	PLANIFICACION: Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional SGR-EPN, suscrito	5-Entregables Intermedios	17/02/2023		17/02/2023		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: Tránsito del respectivo presupuesto según convenio con la Escuela Politécnica Nacional, realizada.	5-Entregables Intermedios	17/03/2023		17/03/2023		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Informes del administrador/a respecto a la ejecución del convenio con la Escuela Politécnica Nacional, suscrito.	5-Entregables Intermedios	27/12/2023		27/12/2023		Sí	3.0
9	CIERRE: Informe de lecciones aprendidas 2023, realizado.	5-Entregables Intermedios	25/01/2024		25/01/2024		Sí	3.0
10	CIERRE: Informe del proyecto año 2023, elaborado.	5-Entregables Intermedios	25/01/2024		25/01/2024		Sí	3.0
11	EJECUCIÓN: Contratación de personal educacional para la gestión de riesgos.	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	3.0
12	EJECUCIÓN: Contratación de servicios de consultoría para la construcción del diseño y puesta en marcha de la	5-Entregables Intermedios	30/04/2024	30/04/2024			No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	campaña educomunicacional ante riesgo de erupción volcánica.							
13	EJECUCIÓN: Impresión de material educomunicacional para sensibilización de la población expuesta a la amenaza volcánica y otras amenazas.	5-Entregables Intermedios	30/04/2024		30/06/2024		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN: Adquisición de linternas y megáfonos para el kit de fortalecimiento de capacidades de los Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos.	5-Entregables Intermedios	30/05/2024		30/06/2024		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN: Adquisición de materiales impresos para el kit de fortalecimiento de capacidades de los Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos.	5-Entregables Intermedios	30/05/2024		30/06/2024		Sí	3.0
16	EJECUCIÓN: Adquisición de mochilas, chalecos y gorras para el kit de fortalecimiento de los CCGR, por catálogo electrónico.	5-Entregables Intermedios	30/05/2024		31/10/2024		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN: Elaboración de videos de realidad virtual sobre la amenaza volcánica	5-Entregables Intermedios	30/05/2024	30/05/2024			No	3.0
18	EJECUCIÓN: Elaboración de videos sobre testimonios de personas que estuvieron en los procesos eruptivos del Tungurahua y Cotopaxi.	5-Entregables Intermedios	30/06/2024		30/06/2024		Sí	3.0
19	EJECUCIÓN: Servicio de consultoría para el diseño y montaje de exposiciones fotográficas/artísticas sobre erupciones volcánicas y otras amenazas.	5-Entregables Intermedios	30/06/2024		27/11/2024		Sí	3.0
20	EJECUCIÓN: Servicio de consultoría para el diseño, montaje y presentación de obras de teatro sobre erupciones volcánicas y otras amenazas.	5-Entregables Intermedios	13/10/2024		27/11/2024		Sí	3.0
21	EJECUCIÓN: Informes del administrador/a respecto a la ejecución del convenio con la Escuela Politécnica Nacional del año 2024, suscrito.	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	3.0
22	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos al IGEPN, realizada	5-Entregables Intermedios	04/04/2025	04/04/2025			No	3.0
23	EJECUCIÓN: Contratación del servicio para la elaboración de material audiovisual con animación de los personajes chasqui y mía la mochila, suscrito	5-Entregables Intermedios	15/05/2025	15/05/2025			No	3.0
24	EJECUCIÓN: Contrato de Adquisición de tótems informativos para zonas priorizadas que se encuentran	5-Entregables Intermedios	15/05/2025	15/05/2025			No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	expuestas a amenazas de inundaciones y deslizamientos, suscrito.							
25	EJECUCIÓN: Contrato de Servicio de impresión de material educomunicacional en español, braille, kichwa/ lenguas nativas, para la diseminación de la gestión inclusiva del riesgo de desastre, suscrito	5-Entregables Intermedios	15/05/2025	15/05/2025			No	3.0
26	EJECUCIÓN: Contrato de Servicio para la elaboración de material educomunicacional - audiovisual con relatos de personas que sobrevivieron o experimentaron los sucesos eruptivos de los volcanes en Ecuador, suscrito.	5-Entregables Intermedios	16/06/2025	16/06/2025			No	3.0
27	EJECUCIÓN: Contrato de Estudio para la elaboración de Metodología para la identificación del índice de riesgo volcánico a nivel nacional, suscrito	5-Entregables Intermedios	15/07/2025	15/07/2025			No	3.0
28	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría para fortalecer el proceso de sensibilización en prevención del riesgo de desastres dirigido a la ciudadanía a nivel nacional, suscrito	5-Entregables Intermedios	15/08/2025	15/08/2025			No	3.0
29	CIERRE: Informe de lecciones aprendidas, realizado.	9-Entregables Formales	05/01/2026	05/01/2026			No	7.0
30	CIERRE: Informe del proyecto, elaborado.	9-Entregables Formales	05/01/2026	05/01/2026			No	7.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C1.1: Número de sensores sísmicos - bb		-	-	-	01/01/2024	-
2	C1.2: Número de equipos para medición de deformación volcánica (GPS)		-	-	-	01/01/2024	-
3	C1.3: Número de estaciones de lahares y medición de gases.		-	-	-	01/01/2024	-
4	C2.1: Número de normas emitidas para la reducción de riesgos de amenazas de actividad volcánica.		-	-	-	01/01/2024	-
5	C2.2: Número de GAD Municipales asesorados para reformar el plan de uso y gestión de suelo.		-	-	-	01/01/2024	-
6	C2.3: Número de catálogos de objetos por riesgos volcanicos oficializados.		-	-	-	01/01/2024	-
7	C2.4: Número de volcanes que cuentan con mapas evacuación.		-	-	-	01/01/2024	-

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
8	C3.1: Número de personas sensibilizadas en temas relacionados a peligros y actividad volcánica.		-	-	-	01/01/2024	-
9	C3.2: Número de personas que aprueban los cursos virtuales de gestión de riesgos de desastres en la plataforma del SNGRE.		-	-	-	01/01/2024	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,616,124.03 **
Costo Total:	1.00
Total Devengado:	765,888.08
% Costo Total Devengado:	76,588,808.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 76,588,808.00 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	845,700.80	0.00	0.00	845,700.80
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	4,227,589.41	0.00	0.00	4,227,589.41
Ppto. Codificado	845,700.80	0.00	0.00	845,700.80
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	925,268.00	850,235.95	0.00	1,775,503.95
Ppto. Devengado	765,888.08	0.00	0.00	765,888.08
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 765,888.08	0.00	0.00	765,888.08
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	159,379.92	850,235.95	0.00	1,009,615.87
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 82.77 %	0.00 %	0.00 %	43.14 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025

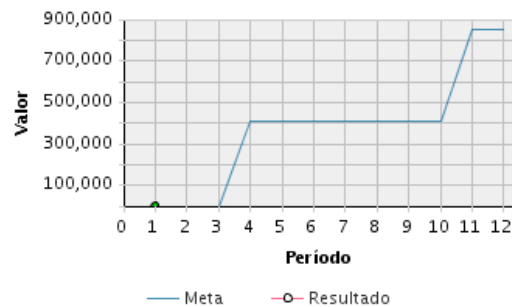

Presupuesto Mensual 2025

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	406,603.95		406,603.95				
May	0.00		406,603.95				
Jun	0.00		406,603.95				
Jul	0.00		406,603.95				
Ago	0.00		406,603.95				
Sep	0.00		406,603.95				
Oct	0.00		406,603.95				
Nov	443,632.00		850,235.95				
Dic	0.00		850,235.95				
Total	850,235.95	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar las capacidades de gestión de riesgos de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos MEDIANTE la implementación de procesos de capacitación, sensibilización, asistencia técnica y difusión de información para implementar acciones de reducción de riesgos en el marco de una cultura de prevención.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Hito 01. Proyecto Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el riesgo de desastres en la población.	A1_Proyecto_fortalecimiento_volcanico-hito_1.pdf	21/11/2024
2	Hito 02. Dictamen de prioridad del proyecto.	A2.Dictamen_de_prioridad_del_proyecto-hito_2.pdf	21/11/2024
3	Hito 03. Asignación de presupuesto.	A3_Asignación_de_presupuesto-hito_3.pdf	21/11/2024
4	Hito 04. Convenio marco de cooperación interinstitucional entre SNGR y EPN.	A4_convenio_marco_de_cooperación_sngre_epn-hito_4.pdf	21/11/2024
5	Hito 05. Designación del líder del proyecto.	A5_Designación_líder_del_proyecto-hito_5.pdf	21/11/2024
6	Hito 06. Convenio específico entre la SNGR y EPN.	A6_Convenio_específico_cooperación_interinstitucional_sgr-epn-hito_6.pdf	21/11/2024
7	Hito 07. Transferencia del presupuesto a la EPN según convenio específico.	A7_Transferencia_del_presupuesto_a_la_EPN-hito_7.pdf	21/11/2024
8	Hito 08. Información de la administración del convenio SNGR-EPN.	A8_Información_carpeta_administración_convenio_IGEPN-hito_8.zip	21/11/2024
9	Hito 09. Informe de lecciones aprendidas.	A9_Informe_de_lecciones_aprendidas-hito_9.pdf	21/11/2024
10	Hito 10. Informe del proyecto 2023.	B1_Informe_del_proyecto_2023-hito_10.pdf	21/11/2024
11	Hito 11. Contratación de personal educacional para la gestión del riesgo.	B2._Hito_no_cumplido-hito_11-signed-1-signed.pdf	17/12/2024
12	Hito 12. Adquisición de maquetas didácticas para sensibilización sobre riesgos volcánicos.	B3._actas_de_entrega_de_recepcion.zip	06/12/2024
13	Hito 13. Impresión de material educacional para sensibilización.	B4_Servicio_de_impresión-hito13-15.zip	22/11/2024
14	Hito 14. Adquisición de artículos para el kit de fortalecimiento.	B5_Adquisición_artículos_varios_para_kit-hito_14.zip	22/11/2024
15	Hito 15. Impresión de material educacional para el kit fortalecimiento.	B6_Servicio_de_impresión-hitos13-15.zip	22/11/2024
16	Hito 16. Adquisición de gorras y mochilas para el kit de fortalecimiento.	B7_Adquisición_de_gorras_y_mochilas-hito_16_.zip	22/11/2024
17	Hito 17. Elaboración de videos de realidad virtual sobre la amenaza volcánica.	B8._Hito_no_cumplido-hito_17-signed-signed.pdf	17/12/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	Hito 18. Elaboración de material audiovisual.	B9_Elaboración_de_material_educomunicacional_audiovisual_hito_18.zip	25/11/2024
19	Hito 19. Servicio de consultoría para el diseño y montaje de exposiciones fotográficas/artísticas sobre erupciones volcánicas y otras amenazas.	C1._Contrato_RE-OACL-SNGR-2024-001-hito_19.pdf	20/12/2024
20	Hito 20. Servicio de consultoría para el diseño, montaje y presentación de obras de teatro sobre erupciones volcánicas y otras amenazas.	C2._Contrato_RE-OACL-SNGR-2024-001-hito_20.pdf	20/12/2024

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gilces Bravo, Stefany Maryolaine	Titular del proyecto	Directora de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos.	director.capacitacion@gestionderiesgos.gob.ec	
Hermenejildo De La A, Andrea Valeria	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria General de Gestión de Riesgos	subsecretario.general@gestionderiesgos.gob.ec	
Salvador Mosquera, Gustavo Alejandro	Líder del proyecto	Subsecretario de Reducción de Riesgos	subsecretario.reduccion@gestionderiesgos.gob.ec	
